


Presentatie Wijkraad

Wijkvernieuwing Wesselerbrink



10 januari 2013



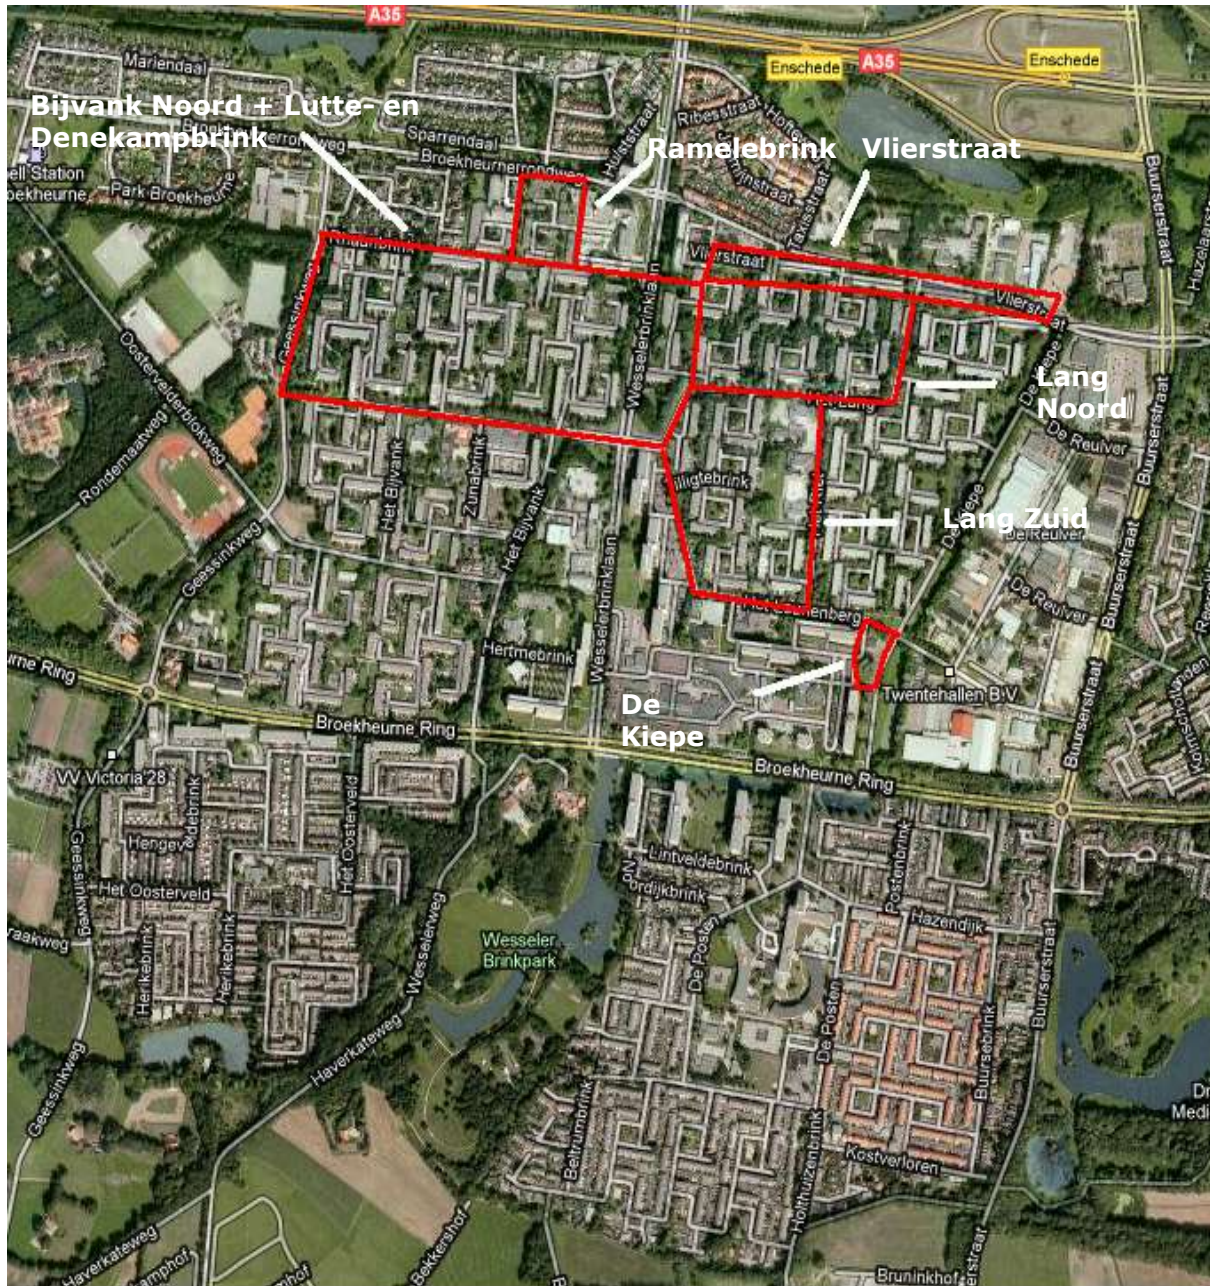

Ramelebrink




Ramelebrink



Bijvank – Noord

- Sloop van alle te renoveren hobbykamerwoningen in fase 2 t/m 5
- Nieuwbouw hobbykamerwoningen voor in de plaats
- Ontstaan fase VI
- Scenario 6 en 12 maanden
- Stadsverwarming

Fasering huidige situatie

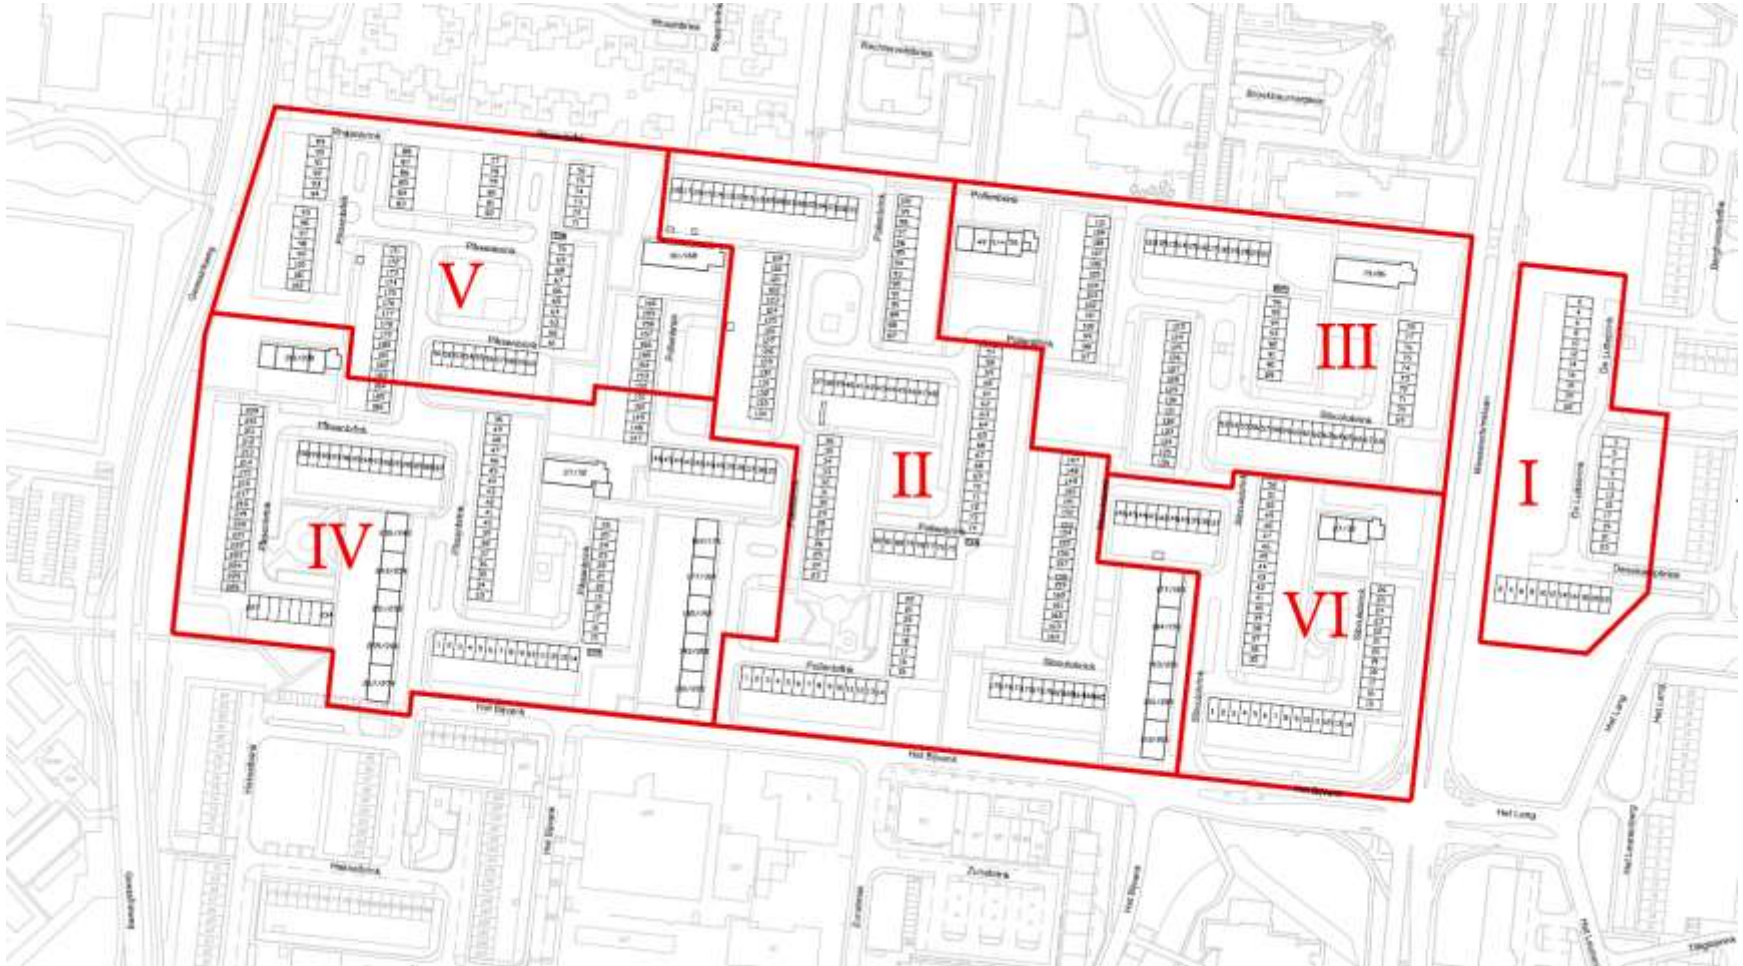

Fasering toekomstige situatie



Typologieën kaart



Planning: 6- of 12 maanden scenario

	Het oude scenario	Nieuw scenario: 6 maand huuropzeggings- termijn fase 2	Nieuw scenario: 12 maand huuropzeggings- termijn fase 2
Fase 2 Start sloop	2e half jaar 2012	1e half jaar 2013	2e half jaar 2013
Fase 2 Start bouw	1e half jaar 2013	2e half jaar 2013	1e half jaar 2014
Fase 2 Oplevering	1e half jaar 2014	2e half jaar 2014	1e half jaar 2015
Fase 3 Start sloop	1e half jaar 2013	2e half jaar 2013	1e half jaar 2014
Fase 3 Start bouw	2e half jaar 2013	1e half jaar 2014	2e half jaar 2014
Fase 3 Oplevering	2e half jaar 2014	1e half jaar 2015	2e half jaar 2015
Fase 4 Start sloop	1e half jaar 2014	2e half jaar 2014	1e half jaar 2015
Fase 4 Start bouw	2e half jaar 2014	1e half jaar 2015	2e half jaar 2015
Fase 4 Oplevering	1e half jaar 2016	1e half jaar 2016	2e half jaar 2016
Fase 5 Start sloop	2e half jaar 2014	1e half jaar 2015	2e half jaar 2015
Fase 5 Start bouw	1e half jaar 2015	2e half jaar 2015	1e half jaar 2016
Fase 5 Oplevering	1e half jaar 2016	2e half jaar 2016	1e half jaar 2017
Fase 6 Start sloop	N.v.t.	2e half jaar 2016	1e half jaar 2017
Fase 6 Start bouw	N.v.t.	1e half jaar 2017	2e half jaar 2017
Fase 6 Oplevering	N.v.t.	2e half jaar 2017	1e half jaar 2018

Stand van zaken fase 1

- Stand van zaken
- Planning




Stand van zaken fase 2

- Stand van zaken
- Planning



PLANNING OP BASIS VAN HUUROPZEGGINGSTERMIJN VAN 6 MAANDEN

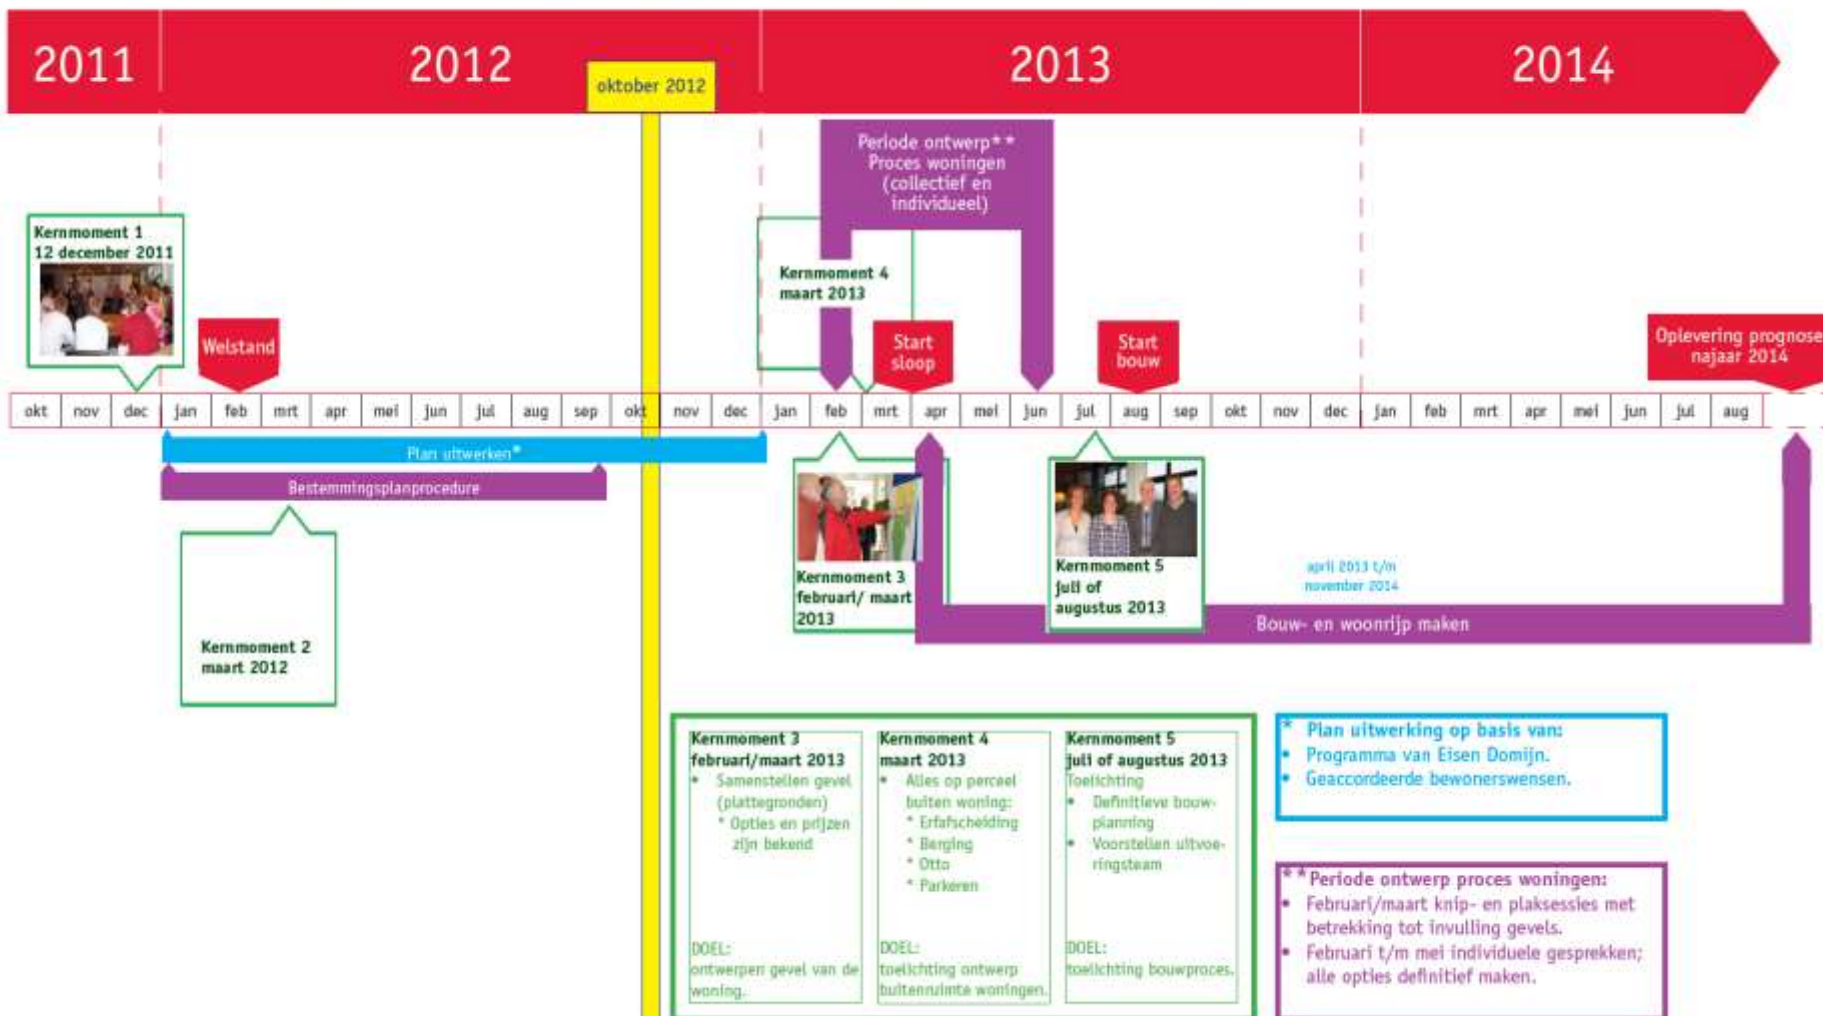

Stand van zaken fase 3

- Stand van zaken
- Planning



Vragen ?

